


Sportovně-rekondiční centrum (SRC) ČNB – 31.10.2024

	Název	Přiřazeno komu	Začátek	Konec	Dokončeno... kvě 26	čvc 7	srp 18	zář 29	lis 10	pro 22	úno 2
1	Přípravné práce		2. 6. 2025	6. 6. 2025	0						
2	Předání staveniště		2. 6. 2025	2. 6. 2025	0						
3	Zaškolení pracovníků pro pohyb v objektu		3. 6. 2025	3. 6. 2025	0						
4	Ochrana staveniště		4. 6. 2025	6. 6. 2025	0						
5	Bourání		9. 6. 2025	10. 7. 2025	0						
6	Odpojení TZB		9. 6. 2025	9. 6. 2025	0						
7	Demontáž zařízení Fitness a Hygienické		10. 6. 2025	11. 6. 2025	0						
8	Přesun zařízení Fitness a Hygienické		12. 6. 2025	12. 6. 2025	0						
9	Demontáž zařízení VZT č.11 ze VZT		13. 6. 2025	16. 6. 2025	0						
10	Demontáž a bourání podhledů		13. 6. 2025	19. 6. 2025	0						
11	Demontáž rozvodů VZT č.11 ze SRC		17. 6. 2025	23. 6. 2025	0						
12	Bourání obkladů a omítek		20. 6. 2025	3. 7. 2025	0						
13	Bourání příček		24. 6. 2025	7. 7. 2025	0						
14	Bourání podlah		4. 7. 2025	10. 7. 2025	0						
15	Bourání prostupů pro VZT		8. 7. 2025	10. 7. 2025	0						
16	Konstrukce a rozvody TZB		11. 7. 2025	1. 1. 2026	0						
17	VZT + CHL		11. 7. 2025	24. 7. 2025	0						
18	ZTI + ÚT		11. 7. 2025	24. 7. 2025	0						
19	SIL + SLB		11. 7. 2025	7. 8. 2025	0						
20	Koncové prvky TZB		12. 12. 2025	1. 1. 2026	0						
21	Svislé konstrukce		11. 7. 2025	18. 8. 2025	0						
22	Zdivo, příčky a přizdívky		11. 7. 2025	17. 7. 2025	0						
23	Prosklená příčka		15. 8. 2025	18. 8. 2025	0						
24	Úpravy povrchů		8. 8. 2025	6. 11. 2025	0						
25	Omítky 1.S		15. 8. 2025	21. 8. 2025	0						

Sportovně-rekondiční centrum (SRC) ČNB – 31.10.2024

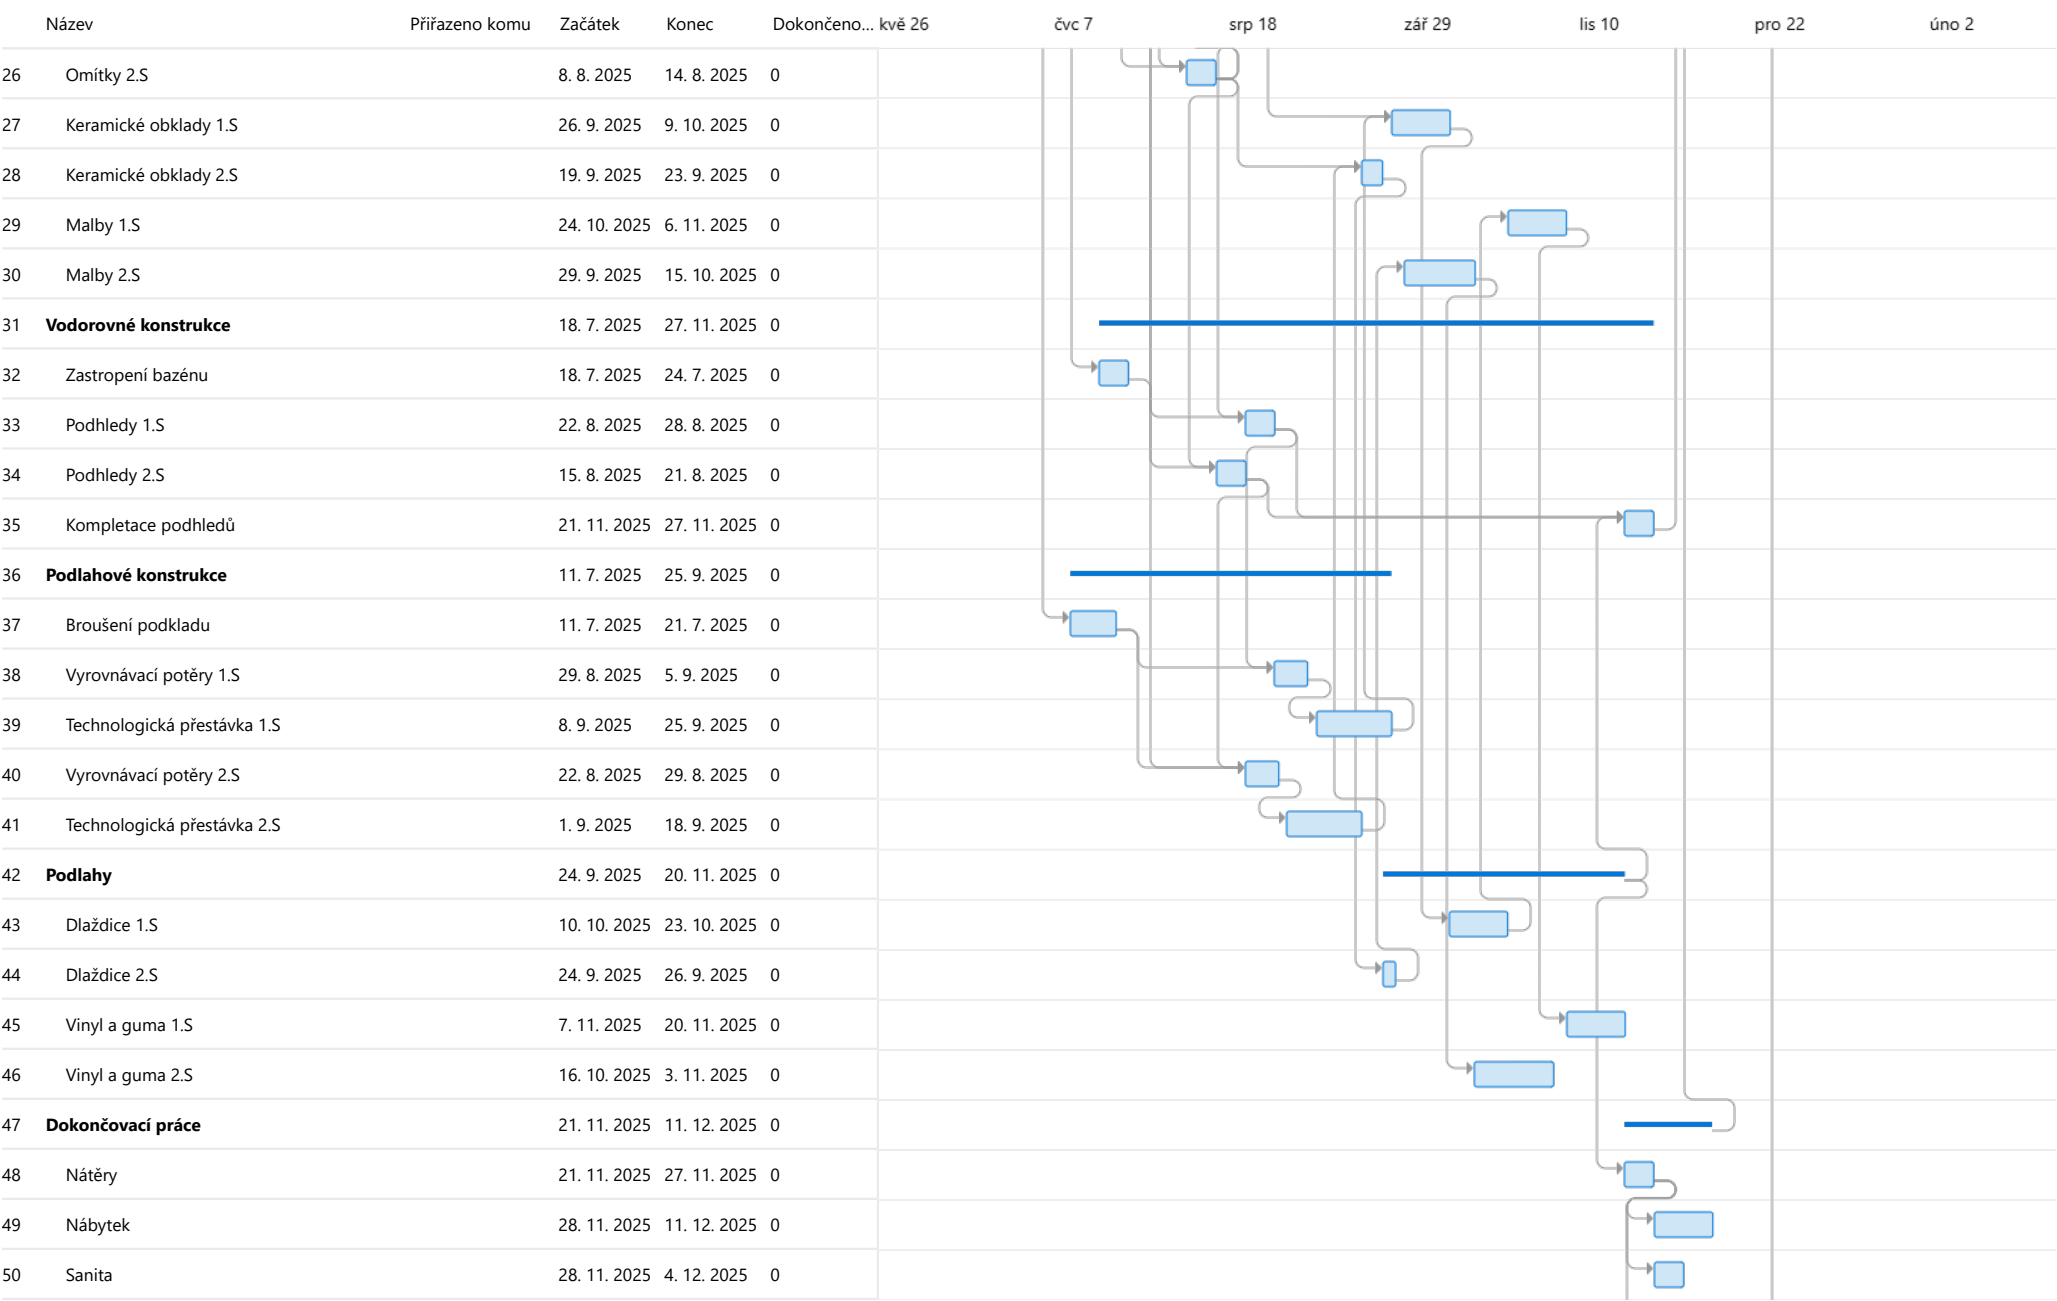

Sportovně-rekondiční centrum (SRC) ČNB – 31.10.2024

Název	Přiřazeno komu	Začátek	Konec	Dokončeno... kvě 26	čvc 7	srp 18	zář 29	lis 10	pro 22	úno 2
51	Zařízení Fitness	28. 11. 2025	11. 12. 2025	0						
52	Uvedení do provozu	2. 1. 2026	6. 2. 2026	0						
53	Revizní a opakovací zkoušky	2. 1. 2026	22. 1. 2026	0						
54	Kolaudace	23. 1. 2026	23. 1. 2026	0						
55	Zaškolení	26. 1. 2026	6. 2. 2026	0						
